

POINT 4 — VUES RANG & CHEMIN DE FER

Deux nouvelles vues du phasage · une seule source · fiche de référence

LE MAILLON MANQUANT — L'OPÉRATION



Une zone = un logement = un chantier. Votre convention « 1 devis = 1 chantier » reste **intacte** : on ajoute seulement un **parent** au-dessus, l'**Opération**, qui regroupe les logements d'une même maison.

Conséquence heureuse : aucun champ « zone » à créer sur les tâches — la zone, c'est le chantier.

Périmètre volontairement **minimal** pour l'instant : le lien entre chantiers + la vue chemin de fer. La marge consolidée et la répartition des coûts communs (base vie, benne, échafaudage) viendront plus tard.

VUE 1 · RANG — L'ORDRE LOGIQUE DÉDUIT DES PRÉDÉCESSEURS

Les prédécesseurs sont au **niveau des tâches** (maille fine). Mais on ne saisit pas 40 liens : le **chaînage par défaut est déduit de l'existant**.

Le chaînage par défaut (gratuit)	Ce qu'on édite (par exception)
Dans un groupe : une tâche suit celle qui la précède dans l'ordre chrono.	Les tâches réellement parallèles (même prédécesseur).
Première tâche d'un groupe : suit la dernière du groupe précédent .	Les liens qui sautent d'un groupe à l'autre .
→ Un graphe complet sans rien saisir , à partir de vos groupes et de chrono_ordre.	→ Seules les vraies contraintes sont renseignées à la main.


Rang	1	2	3	4	5
Tâches	Démolition	Réseaux	Placo	Peinture	Sol · finitions

Qui gagne, le manuel ou le déduit ? L'ordre **manuel** (glisser-déposer de la Chrono) reste ce qui est **stocké**. La vue Rang **propose** un réordonnancement et **signale les incohérences** (une tâche placée avant son prédécesseur, un cycle). Une seule source, pas de bagarre entre les vues — le même arbitrage que la frise du CRM.

À terme : les enchaînements internes d'un ouvrage sont toujours les mêmes (repérage → câbles → boîtes → tableau → appareillage → essai). Les stocker **une fois dans la bibliothèque d'ouvrages types** les rendrait pré-remplis à chaque import — comme les cadences.

VUE 2 · CHEMIN DE FER — LES LOGEMENTS DANS LE TEMPS

À l'échelle de l'**Opération** : les **logements en lignes**, le **temps en colonnes**. Chaque équipe descend d'un logement au suivant — l'escalier apparaît.

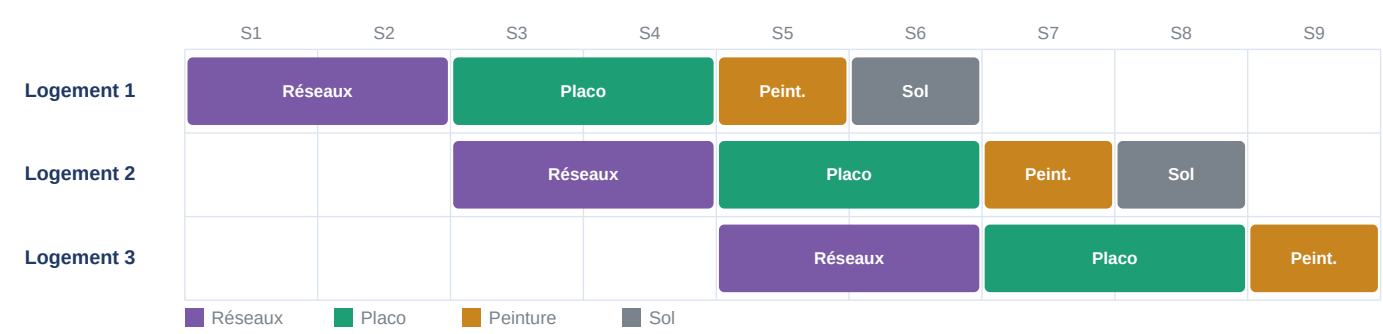

Pourquoi cette vue est faite pour vous. Diviser une maison en trois appartements, c'est trois logements quasi identiques qui s'enchaînent. La même équipe passe du logement 1 au 2 puis au 3, groupe après groupe : c'est exactement le flux répétitif pour lequel le planning géo-temporel a été inventé. Chez vous, ce n'est pas un cas particulier — **c'est la norme**.

La vue lit **date_prevue**, la date déjà partagée par le Gantt et la Chrono : **aucune nouvelle source de dates**. Déplacer une barre écrit date_prevue — donc le Gantt et la Chrono se mettent à jour aussitôt.

UNE SEULE SOURCE — QUI ÉDITE QUOI

Vue	Ce qu'elle édite	Champ de la tâche
Liste	le contenu : lots, ouvrages, tâches, heures	heures_estimees, heures_vendues...
Chronologique	groupe, ordre, date, équipe	chrono_groupe_id, chrono_ordre, date_prevue, ouvriers
Gantt	la date	date_prevue
Prévisionnel	la vue client	(lecture)
Rang (nouveau)	les prédécesseurs → propose l'ordre	predecesseurs (nouveau champ)
Chemin de fer (nouveau)	la date, à l'échelle de l'opération	date_prevue (zone = le chantier)

Un seul champ nouveau sur la tâche : les prédécesseurs. La zone n'en demande aucun (c'est le chantier), et les dates existent déjà. Toutes les vues lisent et écrivent les **mêmes champs** — remplir une vue complète bien les autres, comme le fait déjà le couple Gantt / Chronologique.
